SentinelSSH

Analyseur de logs SSH — Sécurité défensive

Stage 2 — Plan du projet

Portfolio Project — Project Planning (Stage 2 - France)

Anil AKER
Holberton School Bordeaux
Projet de fin d'année — Demo Day / Titre RNCP niveau 5
github.com/anil-akr
30 septembre 2026

> **Le plan en une phrase.** Six semaines, cinq étapes : l'idée, le plan et la documentation technique la première semaine, quatre semaines de développement, puis une semaine de clôture avec le demo day.

Sommaire

1. Le projet en bref 3

2. Plan général du projet 4

Correspondance avec les consignes du Stage 2

Consigne Holberton	Où la trouver
Revoir le but, les objectifs, le périmètre et les éléments clés du projet	§1
Task 0 — Calendrier des 5 étapes du projet	§2.1 et §2.2
Task 0 — Jalons et livrables de chaque étape	§2.3 et §2.4
Task 1 — Plan général partagé (timeline ou diagramme de Gantt)	§2.2

1. Le projet en bref

Cette partie rappelle, en quelques lignes, ce qui a été décidé au Stage 1. Elle sert de base au plan.

1.1 Le but

Un serveur accessible à distance reçoit en permanence des tentatives de connexion automatiques, dont certaines sont des attaques. Elles sont écrites dans un fichier de journal trop long pour être lu à la main. **SentinelSSH lit ce fichier à la place de l'administrateur, repère les adresses suspectes, les classe par niveau de danger et présente le résultat clairement dans une application web.**

1.2 Les objectifs

Objectif	Comment on saura qu'il est atteint	Échéance
Détecter les attaques automatiquement	Les 3 règles de détection donnent le bon résultat sur tous les fichiers d'essai	11 octobre
Enregistrer et protéger les résultats	Les analyses sont conservées, et seul l'administrateur connecté peut les voir	18 octobre
Présenter les résultats clairement	Une fois connecté, on obtient le tableau et le graphique d'une analyse en 3 clics, sur ordinateur comme sur téléphone	25 octobre
Livrer une version fiable et documentée	Version finale testée, installable en suivant le guide, fichier réel de 655 146 lignes analysé sans erreur	1er novembre

1.3 Le périmètre

Ce qui sera livré	Ce qui ne sera pas livré (versions suivantes)
✓ Analyse d'un fichier de journal de connexions ✓ Détection des attaques et niveau de danger (3 niveaux) ✓ Historique des analyses et adresses qui reviennent ✓ Accès protégé par un compte administrateur ✓ Interface web utilisable sur ordinateur et téléphone ✓ Guide d'installation et de mise en service	✗ Blocage automatique des adresses ✗ Surveillance en temps réel ✗ Plusieurs comptes utilisateurs ✗ Autres types de journaux ✗ Mise en ligne publique sur Internet

1.4 Les éléments clés

Élément	Ce qu'il faut retenir
Équipe	Projet individuel : Anil AKER tient tous les rôles (chef de projet, développeur, testeur, rédacteur)
Parties prenantes	Utilisateur cible (administrateur système débutant) · équipe pédagogique Holberton · jury du demo day · jury du titre RNCP niveau 5
Durée	6 semaines, du 28 septembre au 8 novembre 2026, dont 4 semaines de développement
Contraintes	Une seule personne · une application web complète (interface, serveur, base de données) · compétences du titre RNCP à démontrer
Outils de suivi	Tableau de tâches sur GitHub, revue de l'avancement chaque fin de semaine, point hebdomadaire avec l'équipe pédagogique

2. Plan général du projet


2.1 Les grandes phases

Le projet suit les 5 étapes du Portfolio Project. Les trois premières sont courtes, car une grande partie de la réflexion a déjà été faite en préparant le Stage 1.

Période	Étape	Statut
Semaine 1 · 28 sept. → 4 oct.	**Stage 1** — Idée et choix du MVP	**Terminé** (30 sept.)
	Stage 2 — Planification (ce document)	**En cours**
	Stage 3 — Documentation technique	À venir
Semaines 2 à 5 · 5 oct. → 1er nov.	**Stage 4** — Développement du MVP, en 4 sprints d'une semaine	À venir
Semaine 6 · 2 → 8 nov.	**Stage 5** — Clôture : rapport final, demo day, bilan	À venir

Un **sprint** est une période courte (ici une semaine) avec un objectif précis : à la fin de chaque sprint, une partie de l'application fonctionne et peut être montrée.

2.2 Diagramme de Gantt

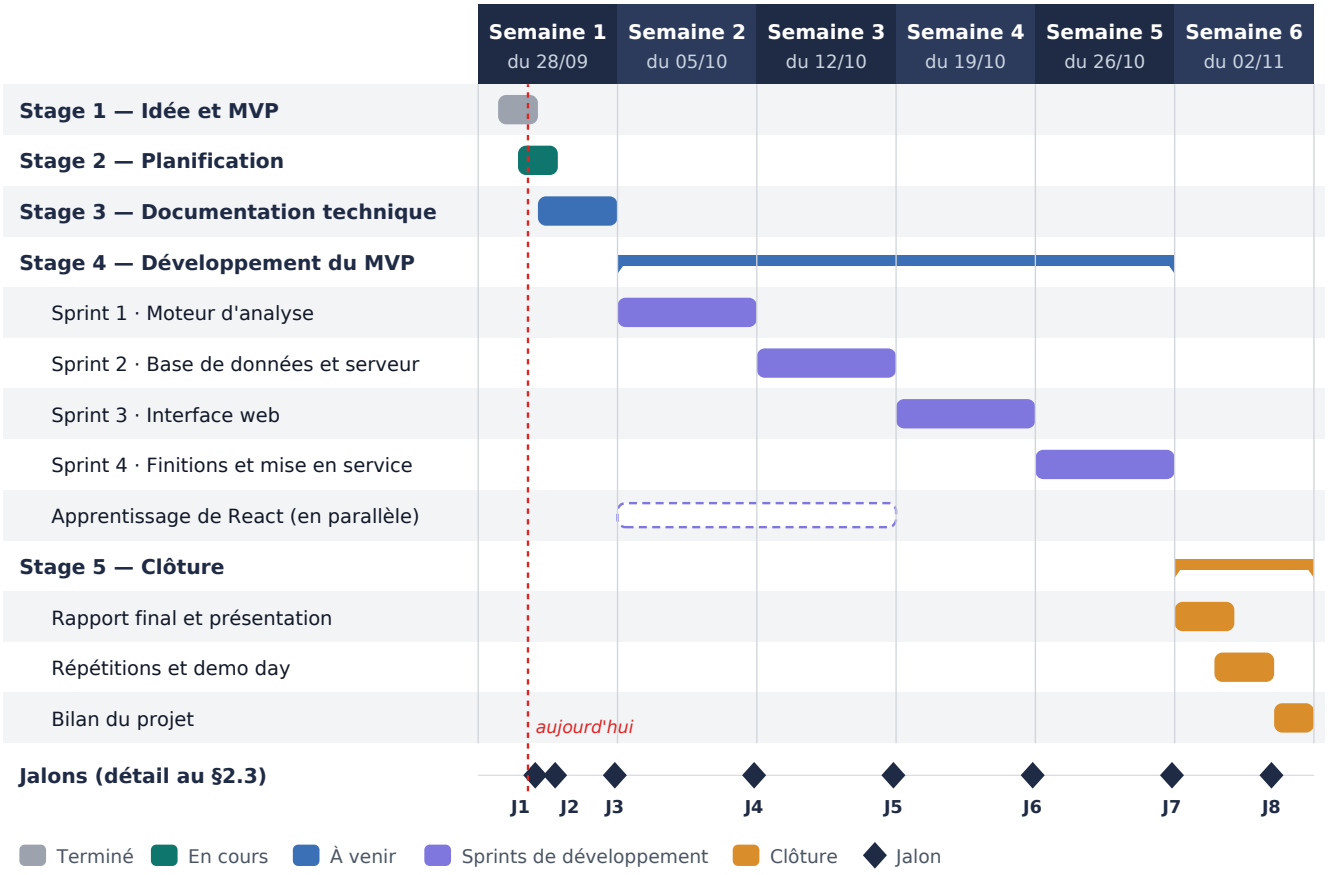

Les barres montrent la durée de chaque étape ; les losanges marquent les jalons. La ligne rouge indique la date de ce document.

> **Date du demo day :** le plan la place en semaine 6 (début novembre). Dès que la date officielle est connue, seules les semaines 5 et 6 sont à ajuster : les 3 premiers sprints ne changent pas.

2.3 Les jalons

Un **jalon** est un moment clé du projet : à cette date, un résultat précis doit être atteint et vérifiable.

Jalon	Date	Ce qui doit être atteint
J1	30/09	Stage 1 Report rendu : équipe, idées explorées, MVP choisi
J2	01/10	Plan du projet terminé et partagé (ce document)
J3	04/10	Documentation technique terminée ; dépôt GitHub et tableau des tâches prêts
J4	11/10	Le moteur d'analyse repère les attaques sur les fichiers d'essai et s'utilise en ligne de commande
J5	18/10	Les résultats sont enregistrés ; la connexion administrateur fonctionne
J6	25/10	L'application complète fonctionne dans le navigateur, sur ordinateur et téléphone
J7	01/11	Version finale 1.0 figée, mise en service et documentée
J8	début nov.	Demo day (date officielle à confirmer)

2.4 Livrables de chaque étape

Étape	Objectif	Livrables
Stage 1 Idée	Former l'équipe, explorer des idées, choisir le MVP	Stage 1 Report : rôles, 6 idées comparées, concept retenu, objectifs, risques
Stage 2 Planification	Organiser le projet dans le temps	Ce plan : calendrier, diagramme de Gantt, jalons, livrables
Stage 3 Documentation technique	Décrire précisément comment l'application sera construite avant de coder	Besoins des utilisateurs (user stories) et maquettes des écrans · schéma de l'architecture · organisation de la base de données · description des échanges entre l'interface et le serveur · plan des tests et de la gestion du code
Stage 4 Développement	Construire le MVP, une partie par semaine	**Sprint 1 :** moteur d'analyse et ses tests **Sprint 2 :** base de données, serveur et connexion sécurisée **Sprint 3 :** interface web (4 pages) **Sprint 4 :** finitions, mise en service, guide d'installation
Stage 5 Clôture	Présenter le projet et en tirer les leçons	Version finale 1.0 · rapport final · présentation du demo day · bilan du projet (ce qui a marché, ce qui est à améliorer)

2.5 Organisation du suivi

- **Chaque fin de semaine :** revue de l'avancement (fait, à faire, blocages) et mise à jour du tableau des tâches.
- **Chaque semaine :** un point d'avancement envoyé à l'équipe pédagogique.
- **Dès qu'un blocage dure plus d'une demi-journée :** demander de l'aide plutôt que de perdre du temps.
- **À chaque jalon :** vérifier que le résultat attendu est vraiment atteint avant de passer à la suite.

2.6 Ce qui pourrait faire glisser le planning

Risque	Ce qui est prévu
L'apprentissage de React (l'outil de l'interface web) prend plus de temps que prévu	Apprentissage commencé dès le sprint 1, en parallèle ; interface volontairement simple
Le sprint 2 est le plus chargé (base de données, serveur et connexion)	Un seul compte administrateur, aucune option supplémentaire
Un imprévu fait perdre quelques jours	Le sprint 4 sert de marge de sécurité ; si besoin, on retire d'abord les bonus, puis le graphique, puis la liste des adresses qui reviennent
La date du demo day est avancée	Les fonctions indispensables sont terminées dès le sprint 3 ; les sprints 4 et 5 se resserrent

2.7 En résumé

Semaine 1 (28 sept. → 4 oct.) : idée, plan et documentation technique.

Semaines 2 à 5 (5 oct. → 1er nov.) : développement du MVP en 4 sprints, un résultat visible chaque semaine.

Semaine 6 (2 → 8 nov.) : rapport final, demo day et bilan.
